

BACKEND · PROYECTO FINAL «SOLUCIONES PARA EL CLENA»

Acta de la reunión de Inception

CLENA Digital — Landing interactiva del CLENA

Equipo de origen	Samuel Lombana (contacto principal) y Alan Fontalvo
Equipo de Backend	Samuel Ramos (Product Owner) · Sebastián Brito (Scrum Master) · Camilo del Toro (Development Team) · Jeison Acosta (Development Team)
Fecha	10 de noviembre de 2026
Versión	1.2

Índice

1. Datos de la reunión 3

2. Contexto recibido del equipo de Introducción 3

3. Problemas identificados 4

4. Evidencias de la visita 5

5. Decisiones de alcance 6

6. Validación del Product Backlog 7

7. Compromisos 8

Firmas 8

1. Datos de la reunión

Fecha	10 de noviembre de 2026
Hora	De 10:41 p. m. a 11:16 p. m. (35 minutos)
Modalidad	Microsoft Teams, grabada y con transcripción
Grabación	«REUNION INCEPTION-20261110_224111-Meeting Recording». Enlace en `docs/evidencias.md` (#38)
Asistentes del equipo de origen	Samuel Lombana y Alan Fontalvo
Asistentes del equipo de Backend	Samuel Ramos (Product Owner)
Dirigió	Samuel Ramos (Product Owner)
Correo de coordinación	Enviado el 9 de noviembre de 2026, con copia a djromerom@uninorte.edu.co

Al empezar se avisó que la reunión se estaba grabando, y los dos integrantes del equipo de origen estuvieron de acuerdo.

2. Contexto recibido del equipo de Introducción

La visita. El 26 de septiembre de 2026, los equipos de Introducción a la Ingeniería de Sistemas visitaron el CLENA (Corporación Luis Eduardo Nieto Arteta, complejo de la antigua Aduana de Barranquilla). Alan Fontalvo hizo allí su servicio social en la **Biblioteca**, organizando los libros por números y letras en las estanterías. En la reunión, el equipo de origen mostró sus fotos y contó lo que vio en cada espacio:

- **Recepción:** al llegar, el personal da la clave de internet y orienta a los visitantes. A la entrada hay un cartel con el mapa de lo que se puede visitar, con la etiqueta «#ViveLaAduana», que también anuncia eventos.
- **Biblioteca:** colección general, sala de lectura tranquila donde la gente trabaja y lee, y zona de computadores.
- **Sala infantil:** al lado de la colección principal, con libros, mesas y computadores para niños.
- **Archivo Histórico:** personas consultando periódicos antiguos en mesas con atril, una bóveda y personal organizando archivos.
- **Museo:** fotografías históricas y un mural con textos sobre la historia del edificio y de la ciudad.

- **Café de la Aduana:** en el primer piso; según el equipo de origen, no es muy amplio, pero es un buen lugar para descansar.

La propuesta original. En su repositorio, el equipo de origen registró esta propuesta:

> *Desarrollar un Landing Page Publicitaria para el CLENA que permita presentar de manera clara, organizada y atractiva su información institucional, sus servicios y sus principales actividades.*

La recomendación del profesor. Según Samuel Lombana, el profesor recomendó que la landing fuera **interactiva**: que se pudiera recorrer el CLENA haciendo clic y arrastrando, como en Street View, y que la historia del lugar apareciera poco a poco (por ejemplo, un cuadro en la esquina inferior izquierda al ver el museo). También pidió que las personas pudieran crear su propia landing interactiva. El equipo de origen lo confirmó en la reunión (decisión 2 de la sección 5).

3. Problemas identificados

Estos son los problemas que el equipo de origen observó en la visita y contó en la reunión. El 12 de noviembre de 2026, Samuel Lombana los confirmó por escrito.

Problema 1. El CLENA no llega a todos los públicos. Fuera de la sala infantil, la mayoría de visitantes eran adultos mayores y había pocos universitarios. En el Archivo Histórico solo había personas de la tercera edad leyendo periódicos antiguos, aunque es un espacio útil, por ejemplo, para universitarios que estudian historia o necesitan datos de una época. El equipo de origen propone **más publicidad**, para que la gente conozca el CLENA y su historia, y para que los más jóvenes se interesen por lo que ofrece, como los libros de la Biblioteca.

- **Cómo lo atiende el proyecto:** es el objetivo de la landing publicitaria. El recorrido muestra los espacios a quien no ha ido (#7 a #12), la landing publica servicios y horarios (#42, #43), y la agenda y las inscripciones dan a conocer los eventos (#44 a #46).

Problema 2. Falta un componente educativo para los niños. En la sala infantil, el equipo de origen propone un programa educativo para los niños, con actividades como preguntas tipo Kahoot o Quizizz, para que adquieran conocimiento mientras se mantienen interesados.

- **Cómo lo atiende el proyecto:** queda fuera del alcance de la Entrega 1 y se registra como idea para el backlog.

Problema 3. Los computadores de búsqueda de la Biblioteca son muy antiguos. El profesor propuso agregar un computador moderno para buscar libros, sin reemplazar el

antiguo: quienes van con frecuencia ya saben usar ese, y cambiarlo de golpe sería un cambio muy abrupto para ellos.

- **Cómo lo atiende el proyecto:** es un problema de equipos, no de software, y queda fuera del alcance. La landing sí cuida a ese mismo público de adultos mayores: el texto se puede ampliar al doble, tiene buen contraste y se puede usar con teclado y con lector de pantalla (#13, #14).

4. Evidencias de la visita

Fotos tomadas por Samuel Lombana con la cámara Kodak PIXPRO SP360 el 6 de noviembre de 2026, en otra visita al CLENA, posterior a la del 26 de septiembre, para tomar las fotos del recorrido. Las personas que aparecían están difuminadas. Los originales están en el Drive del equipo; en el repositorio solo están las versiones comprimidas del recorrido. En la reunión, **Samuel Lombana y Alan Fontalvo autorizaron que se usen todas las fotos**. El equipo de origen no tiene videos de la visita.

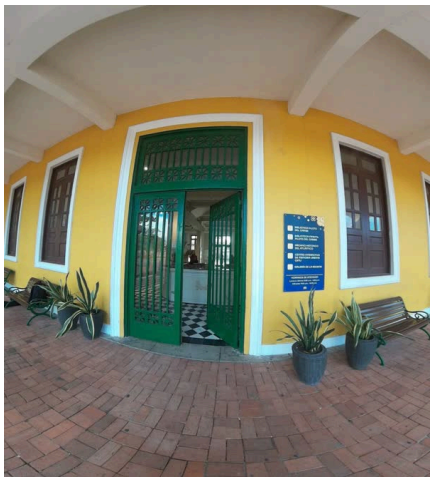


Figura 1. Entrada principal del complejo de la Aduana

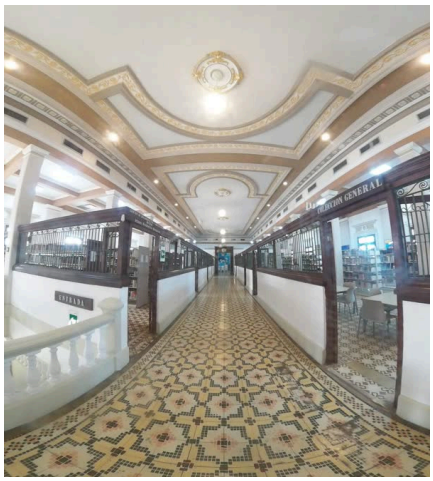


Figura 2. Pasillo central de la Biblioteca



Figura 3. Sala infantil

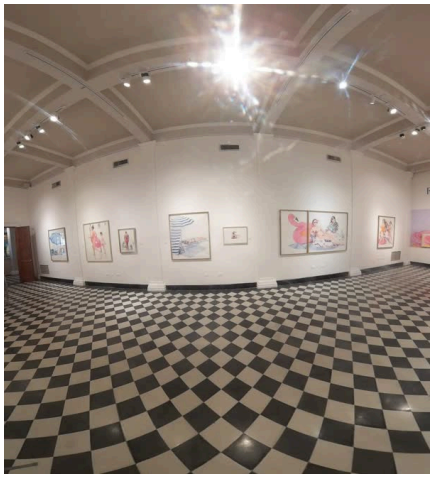


Figura 4. Sala de exposiciones



Figura 5. Archivo Histórico (personas difuminadas)

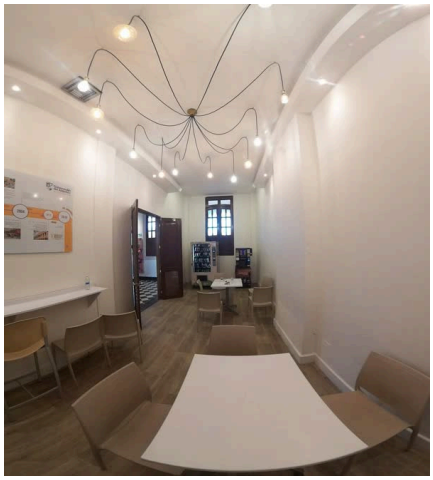


Figura 6. Café de la Aduana

5. Decisiones de alcance

Estas son las decisiones que el equipo de Backend ya había tomado. Se presentaron una por una para que el equipo de origen las confirmara o las cambiara.

#	Decisión	Por qué	Issues	¿Confirmada?
1	El proyecto es **CLENA Digital**, con las cuatro funcionalidades obligatorias de la Entrega 1: secciones administrables (espacios, servicios, horarios), agenda de eventos por fechas, galería con carga de imágenes e inscripción a eventos con correo	Es lo que exige la rúbrica de la Entrega 1 para este proyecto	#42 a #48	Sí
2	El **recorrido tipo Street View** es la sección «Espacios» de la landing, con la historia de cada sala en la esquina inferior izquierda	Responde a la recomendación del profesor	#7 a #12	Sí
3	**«Crea tu propio recorrido» queda para después** de la Entrega 1	No está entre las funcionalidades obligatorias y no alcanza el tiempo	#17 a #23	Sí
4	**Tres roles:** administrador, personal del CLENA y usuario público. Para inscribirse a un evento no hace falta cuenta	Requisito transversal de la rúbrica	#15, #24	Sí, con una sugerencia (ver abajo)

#	Decisión	Por qué	Issues	¿Confirmada?
5	**Fotos de la cámara Kodak** (gran angular, no 360°), enderezadas y con personas difuminadas. El Museo usa fotos anteriores porque el día de la visita no se pudo entrar por un evento	No se usan datos de personas sin autorización	#56	Sí. Autorizaron usar todas las fotos
6	Los **textos de historia** de cada sala son provisionales hasta que el equipo de origen entregue los definitivos	No publicar información incorrecta sobre el CLENA	#11	Sí. Los entrega el equipo de origen (sección 7)
7	Los **servicios y horarios** de la landing son de ejemplo hasta que el equipo de origen entregue los reales	No publicar información incorrecta sobre el CLENA	#43	Sí. Los entrega Alan Fontalvo (sección 7)

Sugerencia sobre la decisión 4. Samuel Lombana propuso que inscribirse a un evento **pida una cuenta**:

- Para que la inscripción no sea anónima y quede registrado quiénes asisten a cada evento.
- Para que al correo de la cuenta les lleguen **avisos de próximos eventos**.

Alan Fontalvo estuvo de acuerdo para los eventos, y agregó que para explorar la landing no debe hacer falta cuenta.

Decisión del equipo: la sugerencia **queda para después de la Entrega 1**. La inscripción sin cuenta ya está construida y cumple lo que pide la rúbrica (inscripción con confirmación por correo), y cambiarla a tres días de la entrega pondría en riesgo algo que ya funciona. Quedó en el backlog como una historia nueva, **HU-26 · Inscribirme con mi cuenta y recibir avisos de próximos eventos** (#95), en el Sprint 3.

Sobre los textos de historia. Samuel Lombana sugirió que los textos, además de describir cada sala, inviten a visitarla. Su ejemplo para el café fue presentarlo como un espacio agradable para tomar algo durante la visita. Se acordó que los textos sean una **descripción general de cada sala, no una opinión**.

6. Validación del Product Backlog

- **Backlog revisado en la reunión:** sí. Se mostraron las 25 historias de usuario en GitHub, agrupadas por épica, con su estado, y se leyeron como ejemplo los criterios de aceptación de la HU-23 (Inscribirme a un evento).

- **Cambios pedidos por el equipo de origen:** ninguno en las historias. Alan Fontalvo dijo que todo estaba bien. La sugerencia sobre la inscripción con cuenta está en la sección 5.
- **Validación por escrito:** Samuel Lombana comentó «Validado» en el issue #49 el 10 de noviembre de 2026 a las 8:43 p. m., antes de la reunión, porque se le pidió revisar el backlog con anticipación. En la reunión (minuto 26 de la grabación) se mencionó esa validación y el equipo de origen la confirmó.

7. Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha
Comentar «Validado» en el issue #49	Samuel Lombana	Hecho el 10 de noviembre de 2026
Enviar por el grupo un PDF con los textos actuales de cada sala, numerados, para que el equipo de origen los complete	Samuel Ramos	11 de noviembre de 2026
Entregar los textos definitivos de cada sala	Samuel Lombana y Alan Fontalvo	A más tardar el 12 de noviembre de 2026
Entregar los servicios y horarios reales del CLENA, confirmados con la profesora que guió el servicio social de Alan Fontalvo	Alan Fontalvo	A más tardar el 12 de noviembre de 2026
Enviar esta acta por correo para su revisión	Samuel Ramos	11 de noviembre de 2026
Asistir a la revisión del Sprint 1	Samuel Lombana y Alan Fontalvo	Fecha por confirmar en el grupo

Horario adelantado en la reunión. Alan Fontalvo encontró que la atención presencial es de **lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m.**, y que los sábados, domingos y festivos no hay atención presencial. Se publica en la landing cuando él lo confirme.

Firmas

La validación del backlog quedó registrada en el issue #49. Estas firmas son opcionales.

Nombre	Rol	Firma
Samuel Lombana	Equipo de origen (contacto principal)	

Nombre	Rol	Firma
Alan Fontalvo	Equipo de origen	
Samuel Ramos	Product Owner	
